

Engineering Change Notice(ECN)

ECN-D-2603-04(ECP AP3-L Process Cable Hole Addition)

FA연구소

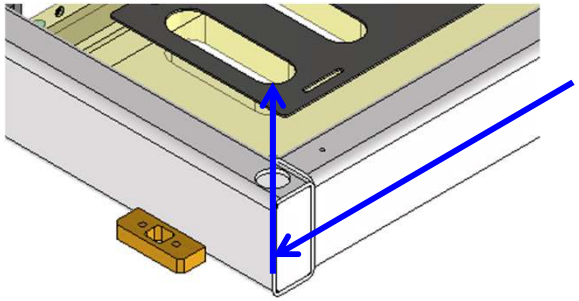
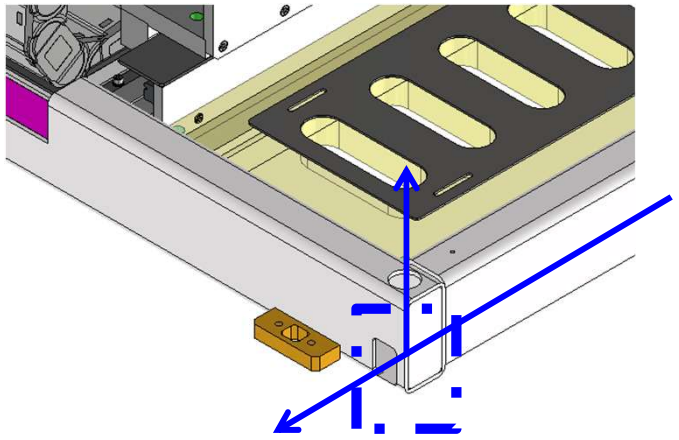
작성	검토	승인
곽수민 프로	최동수 팀장	이태경 본부장
26/01/16	26/01/16	26/01/16

NINEBELL

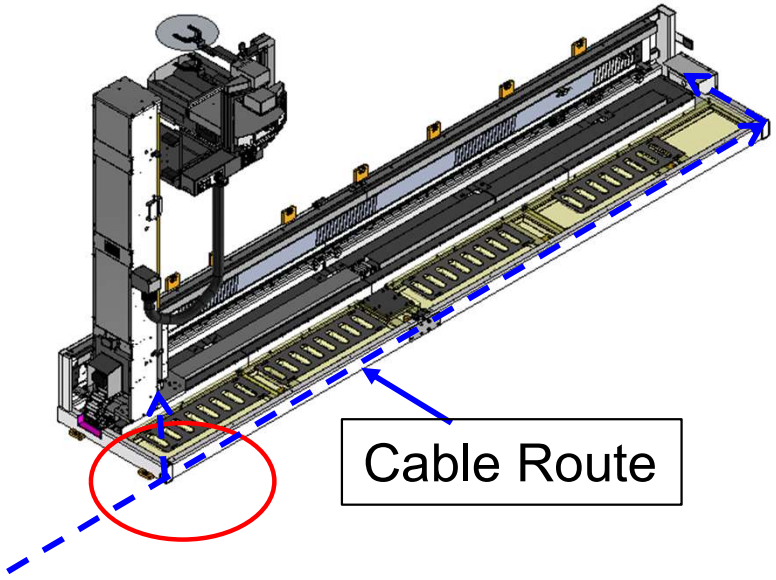
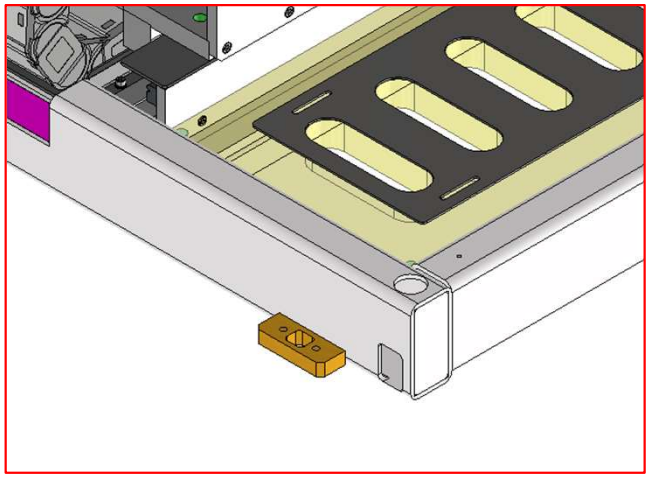
1. Engineering Change Request

N/A

2. Engineering Change Notice

적용 장비 타입 Applicable project type	ECP AP4-L TYPE	적용 범위 Scope	■ 신규 발주분 (New order) □ 기발주분 (Previous order) □ 기출하장비 (Existing shipped equipment)
변경 사유 Reason for change	□ 고객 요청 (Customer request) ■ 품질개선 (Quality improve) □ 원가절감 (Cost reduction) □ 생산성 향상 (Increase productivity) □ 부품 단종 (Part discontinuation) □ 기타 (ETC)	ECR NO.	N/A
		ECN NO.	ECN-D-2603-04
변경 상세 사유 Detailed reason for change	현재 PROCESS FRAME은 끝단 상부에서만 케이블 인출이 가능하여 작업성이 저하됨. 이전 AP4 Type에서 전면 사각 홀을 적용한 이력이 있으므로, 본 사양에도 동일한 구조 적용이 필요함. 이를 통해 케이블 배선 및 유지보수 작업성 향상이 기대됨. Currently, the PROCESS FRAME allows cable routing only from the upper end, resulting in reduced workability. Since the front rectangle cable hole was applied in the previous AP4 Type to address this issue, the same structural change is required for this specification. This change is expected to improve cable routing and maintenance efficiency.		
변경 사항 Changes	변경 전(Before)	변경 후(After)	
			
상세내용 Detail	• EA02P-F200-B001-0, L FRAME , 1EA	• EA02P-F200-B001-1, L FRAME , 1EA	

2. Engineering Change Notice

전체 이미지 Full Image	**VIEW : AP3-L TYPE**   ※변경 위치 혹은 관련 위 표시 ※Show changes or related positions

유효성 검토 결과 Test Result	검토 여부 Test or not	Y / N	유효성 검토 부서 Department	N/A	첨부파일 유무 Attachments	Y / N
승인 날짜 Approval date	1. Ninebell : 2026.03.12 2. Customer : / /		나인벨 승인 Ninebell approval	QC 2026.03.12 PASS	고객사 승인 Customer approval	
적용 일자 Effective date	After Approval 2026.03.19~		최초 적용 장비 Initially Applied Equipment	After Approval		
