

Engineering Change Notice(ECN)

ECN-D-2609-06

(PUSHER DOG 체결부 C`B 깊이 변경 건)

FA연구소 설계1팀

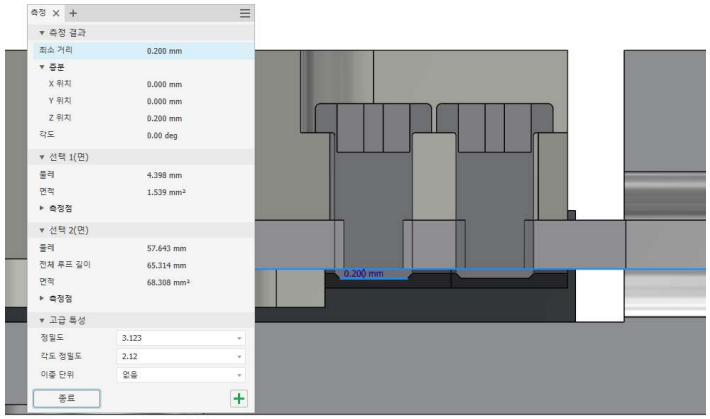
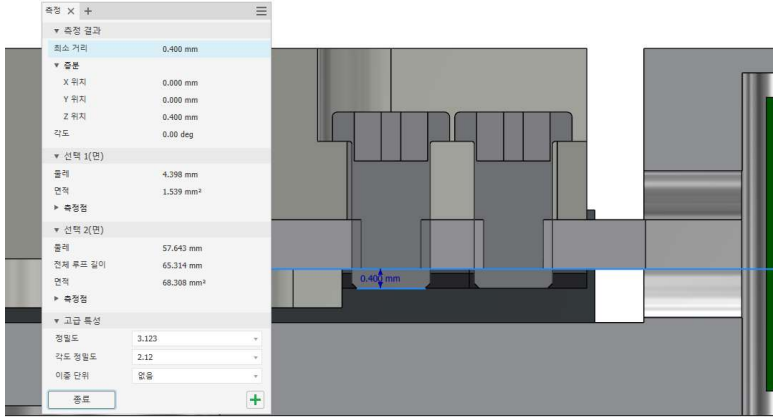
작성	검토	승인
원준연 프로	주성진 팀장	이태경 본부장
2026/09/16	2026/09/16	2026/09/16

NINEBELL

1. Engineering Change Request

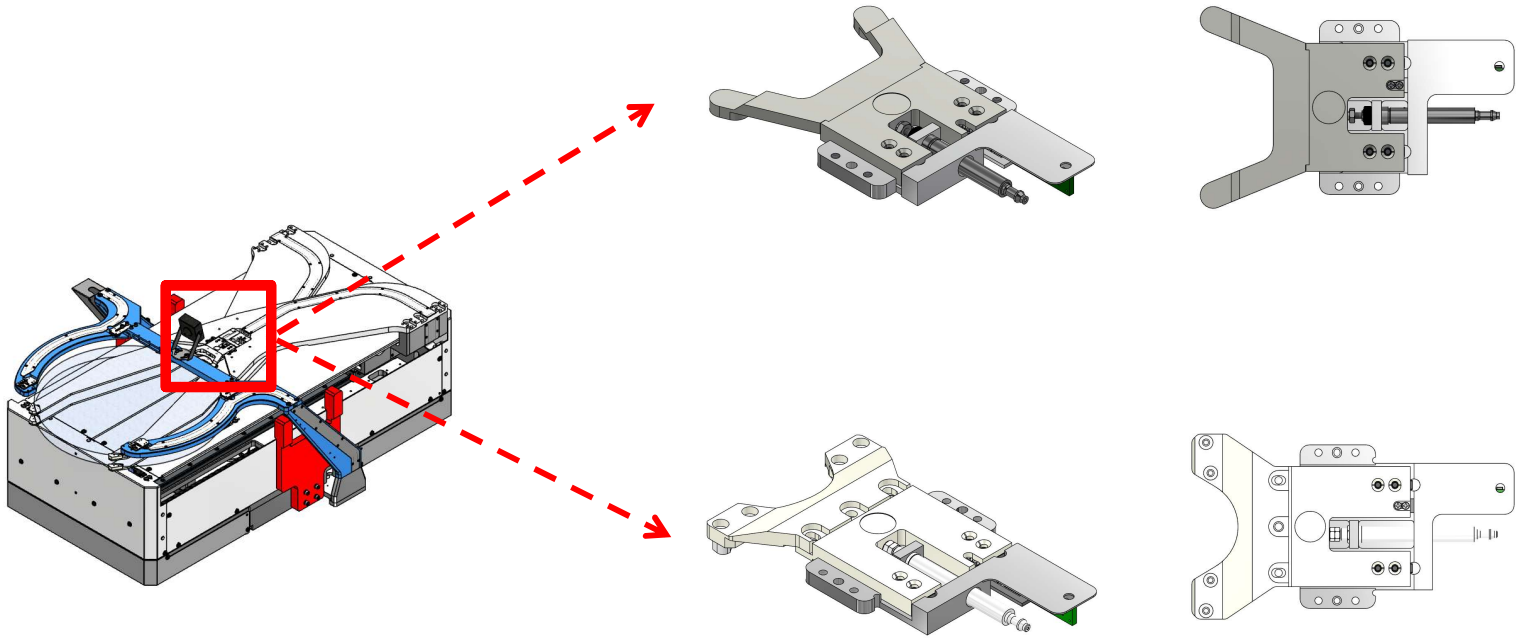
N/A

2. Engineering Change Notice

적용 장비 타입 Applicable project type	8CH, 8CH FS, 8CH ST250 PUSHER 12CH, 12CH HIZ, 18CH , HINIX 등 (BS 제외한 모든 PUSHER)	적용 범위 Scope	■ 신규 발주분 (New order) □ 기발주분 (Previous order) □ 기출하장비 (Existing shipped equipment)
변경 사유 Reason for change	□ 고객 요청 (Customer request) ■ 품질개선 (Quality improve) □ 원가절감 (Cost reduction) □ 생산성 향상 (Increase productivity) □ 부품 단종 (Part discontinuation) □ 기타 (ETC)	ECR NO.	N/A
		ECN NO.	ECN-D-2609-06
변경 상세 사유 Detailed reason for change	1. PUSHER DOG 체결 시, 체결 볼트의 불완전 나사부로 인한 나사산 파손 발생		
변경 사항 Changes	변경 전(Before)	변경 후(After)	
			
상세내용 Detail	1. C`B 깊이 1.7 mm 2. DOG 체결 시, 튀어나오는 BOLT 길이 0.2 mm	1. C`B 깊이 1.9 mm 2. DOG 체결 시, 튀어나오는 BOLT 길이 0.4 mm	

CONFIDENTIAL

2. Engineering Change Notice

전체 이미지 Full Image	 이미지는 참고용으로 두가지만 기입

검토 결과 Test Result	검토 여부 Test or not	Y / N	검토 부서 Department	N/A	첨부파일 유무 Attachments	Y / N
승인 날짜 Approval date	1. Ninebell : 2026 / 09 / 18 2. Customer : N/A		나인벨 승인 Ninebell approval	QC 2026.09.18 PASS	고객사 승인 Customer approval	N/A
적용 일자 Effective date	2026.09.22		최초 적용 장비 Initially Applied Equipment	S/N : X260922-XXXX 이후 모든 Pusher		

3. Attachments

Part No.		
Before	→	After
CMS-300M2-7	→	CMS-300M2-7
CMS-700M2-3	→	CMS-700M2-3
CMS-100M2-A	→	CMS-100M2-A
CMS-100M2-A_MIR	→	CMS-100M2-A_MIR

해당 건은 고객사 승인 없이,
사내 도면만 수정 (Rev x)하는 건 입니다.

CONFIDENTIAL

개정이력

REV	날짜	상세내용	비고
5	2023.08.25	1. 변경점에 대하여 상세하게 알 수 있도록 항목 추가 및 변경 - ECR 캡처본 삽입 슬라이스 추가 - 적용 범위에 기존 출하장비 적용 여부 항목 추가 - 변경 상세 사유 항목 추가 - 변경 위치를 알 수 있도록 전체 이미지 삽입 항목 추가 - 추가 자료 삽입 슬라이스 추가	
6	2025.04.09	적용일자, 적용장비 등 작성 가이드 추가, 텍스트 변경 등 양식 개정	
7	2025.06.04	전자결재 상신 가이드 추가, 고객사 승인 여부 항목 추가, 적용 시점, 장비 기입 가이드 수정	
