Engineering Change Notice(ECN)

ECN-I-2604-13(Scan Robot Motor 단종에 의한 사양 변경)

(Specification change due to discontinuation of Scan robot Motor)

IMP R&D Center

Written	Review	Confirm
안현환	안현환 팀장	손용선 본부장
26/04/16	26/04/16	26/04/16

NINEBELL

Engineering Change Request (ECR) Detail and Dept Review

Requesting Dept.	Yoon Byung-min / Purchasing	**Change Reason**	[ ] Customer Request [ ] [ ] Cost Reduction **[v]** Discontinued Part [ ] [ ] Workability Improvement
Request Date	March 12, 2026		
Applicable Equipment	**Project Type:** SCAN ROBOT **[v]** Mass Production **[v]** Development		**Change Level: [v]** Level 1: When [ ] Level 2: Simple change or work method change

Before Change (Issues & Request Details)			After Change (Expected Results)			
No.	**Existing Name**	**Changed Name**	**Category**	**Before Change**	**After Change**	**Remarks**
1	SHA25Y81SG-B09B200-17S1	**SHA25Y81SG-B09B200-37S1**	**IF Board**	**Old Internal IF Board**	**New Board Installed**	**No difference in performanc**
2	SHA32Y81SG-B12B200-17S1	**SHA32Y81SG-B1B2200-37S1**	**Backup Capacitor**	**Capacitor Installed**	**Capacitor Removed**	**Removo/ part discontinual tion**
3	SHA40Y121SG-B15B200-17S1	**SHA40Y21SG--B15B200-37S1**				

Related Dept.	[ ] Mechanical Design	**Potential Risks**	[ ] Instrument & Tooling costs incurred
	[ ] Electrical Design		[ ] Work process change & increased work time
	[ ] Manufacturing		[ ] Mechanical defect
	[ ] Purchasing		[ ] Other:
	[ ] Quality Control		

NINEBELL

1. Engineering Change Request KOR

NINEBELL	설계 변경 요청서(ECR) (Engineering Change Request)	고객사	ACM
		ECR No.	ECR-Q-0000-00

의뢰부서	의뢰자 / 의뢰본부	윤병민/구매	변경 사유	☐ 고객요청 ☐ 원가절감 ☐ 품질개선 ☐ 작업성 향상 ☑ 부품 단종 ☐ 기타
	의뢰일자	26.03.12.		

적용 요청 장비	분류	Project Type	변경 Level (Change Level)		
	☑ 양산 ☑ 개발	SCAN ROBOT		☑ Level 1	설계 구조 변경이 필요할 시
				☐ Level 2	단순 파트 변경 및 작업방법 변경 시

변경 전(문제점 및 변경 요청사항)

순번	기존 제품명	변경 제품명
1	SHA25Y81SG-B09B200-17S17bA-C	SHA25Y81SG-B09B200-37S17bA-C
2	SHA32Y81SG-B12B200-17S17bA-C	SHA32Y81SG-B12B200-37S17bA-C
3	SHA40Y121SG-B15B200-17S17bA-C	SHA40Y121SG-B15B200-37S17bA-C

변경 후(기대효과)

구분	변경 전	변경 후(사양 변경)	비고
IF 보드	구형 내장 IF 보드	신규 IF 보드 탑재	성능/사양 차이 없음
백업콘덴서	콘덴서 탑재	콘덴서 미탑재	부품 단종에 따른 삭제

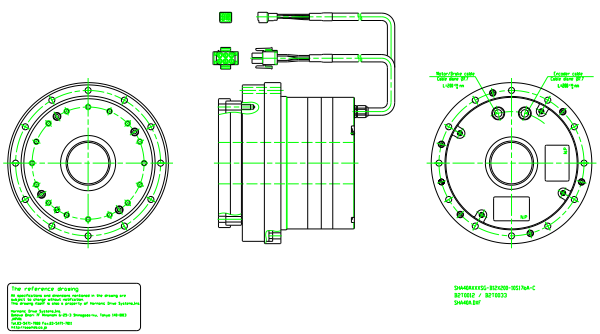
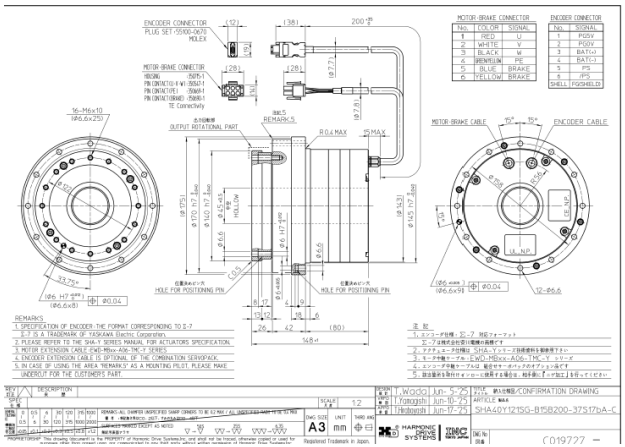
1) 내장 IF 보드 변경 : 사양 변경 없음

2) 콘덴서 미탑재 : 전원차단 및 재인가시 무조건 알람 클리어 필요

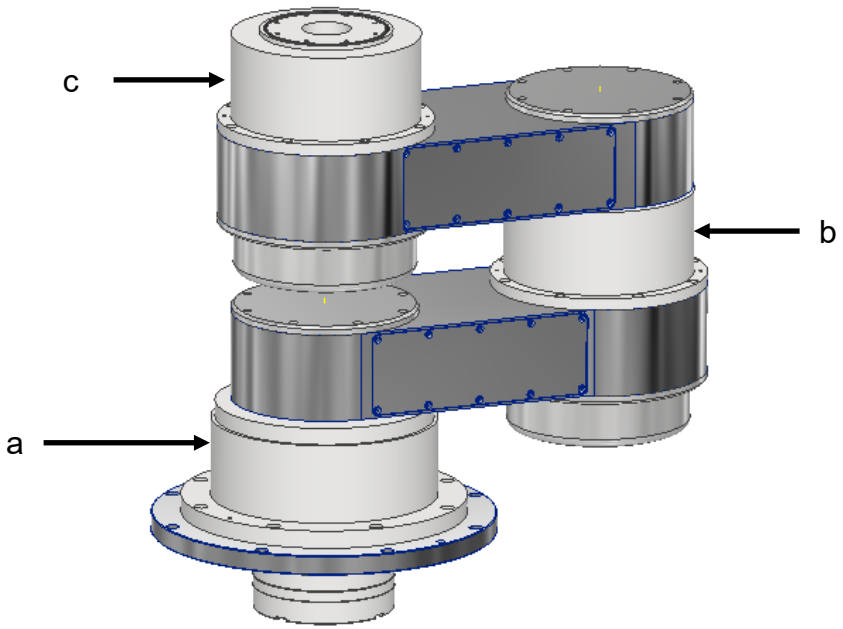
유관부서		
	☐	기구설계
	☐	전장설계
	☐	제조본부
	☐	조달본부
	☐	품질본부

잠재적 문제점		
	☐	계측기 & 공구 추가 배용 발생
	☐	작업 Process 변경 및 작업 시간 증가
	☐	기계적 결함
	☐	기타 의견 :

2. Engineering Change Notice

적용 장비 타입 Applicable project type	Scan Robot	적용 범위 Scope	■ 신규 발주분 (New order) □ 기발주분 (Previous order) □ 기출하장비 (Existing shipped equipment)
변경 사유 Reason for change	□ 고객 요청 (Customer request) □ 품질개선 (Quality improve) □ 원가절감 (Cost reduction) □ 생산성 향상 (Increase productivity) ■ 부품 단종 (Part discontinuation) □ 기타 (ETC)	ECR NO.	ECR-P-2603-05
		ECN NO.	ECN-I-2604-13
변경 상세 사유 Detailed reason for change	제품 외관 및 치수의 변화는 없으며, 모터 내부의 보드 단종으로 인해 신규보드를 탑재했고, 내부 콘덴서 제거로 인해 제품 사양이 변경되었음. "While the external appearance and dimensions remain the same, the product specifications have been updated. This includes a new internal motor board (replacing the discontinued model) and the removal of the internal capacitor."		
변경 사항 Changes	변경 전(Before)	변경 후(After)	
			
상세내용 Detail	• C019727_SHA40Y121SG-B15B200-17S17BA-C • C020093_SHA25Y81SG-B09B200-17S17bA-C • C020386_SHA32Y81SG-B12B200-17S17bA-C	• C019727_SHA40Y121SG-B15B200-37S17BA-C • C020093_SHA25Y81SG-B09B200-37S17bA-C • C020386_SHA32Y81SG-B12B200-37S17bA-C	

2. Engineering Change Notice

전체 이미지 Full Image	 ※변경 위치 혹은 관련 위 표시 ※Show changes or related positions • a : C019727_SHA40Y121SG-B15B200-37S17BA-C • b : C020093_SHA25Y81SG-B09B200-37S17bA-C • c : C020386_SHA32Y81SG-B12B200-37S17bA-C

유효성 검토 결과 Test Result	검토 여부 Test or not	Y / N	유효성 검토 부서 Department	N/A	고객 승인 여부 Customer approval	Y / N
승인 날짜 Approval date	1. Ninebell : 2026.04.29 2. Customer : / /		나인벨 승인 Ninebell approval	QC 2026.04.29 PASS	고객사 승인 Customer approval	JSG confirm 2026/05/25
적용 일자 Effective date	26.04.16		최초 적용 장비 Initially Applied Equipment	NEW PO		
